


STABAC spol. s r. o.

Krycí list

Miesto: Stavba Zariadenie sociálnych služieb - obec Salka		Rozpočet:	
JKSO:		Spracoval:	
Dňa: 31.5.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Salka	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: Stabac spol. s r.o.	IČO:	DIČ:	
Projektant:	IČO:	DIČ:	
0	0	0	0
0	0	0	0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	21 441,05	0,00	21 441,05	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	1 997,78		1 997,78	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	23 438,83	0,00	23 438,83	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
					dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum: _____				dátum: _____		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: _____				pečiatka: _____		17		Inžinierska činnosť
						18		Projektové práce
						19		
						20		Súčet riadkov 16 až 19:
						E		Celkové náklady
						21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
						22		DPH 20% z: 23 438,83
						23		DPH 0% z: 0,00
						24		Súčet riadkov 21 až 23:
						F		Odpočet - prípočet
								0

projektant, rozpočtár, cenár		odberateľ, obstarávateľ	
dátum: _____	podpis: _____	dátum: _____	podpis: _____
pečiatka: _____		pečiatka: _____	



Stavba: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Obstarávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: STABAC spol. s r. o., Komárno Nová Stráž

Rekapitulácia č. 1


1-1 Stavebná časť 18 793,17
2 Zdravotechnika 4 645,66

Spolu bez DPH 23 438,83

V Komárne Novej Stráži
31.05.2021



Ing. Juraj Adam
konateľ spoločnosti

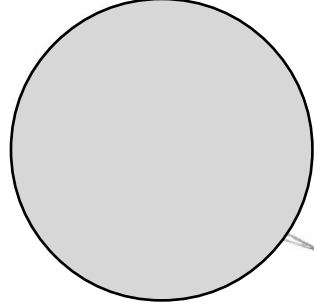

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
1_1 - Stavebná časť

JKSO:
Miesto: **Salka**

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: **31 428 568,00**
IČ DPH: **Sk2020399260**

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: **Ing. Juraj Adam**

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 793,17
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 793,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	18 793,17	20,00%	3 758,63
znižená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 22 551,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum:
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 793,17
HSV - Práce a dodávky HSV	18 793,17
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 793,17
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie kľampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlnové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **18 793,17**

118568 D1C: 2020399260

Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček



Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	
Náklady							18 793,17		
0	HSV	Práce a dodávky HSV						18 793,17	
0	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						18 793,17	
86	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	273,464	11,300	3 090,14		
87	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	24,244	12,000	290,93		
88	K	9620326310	Búranie komínov. muriva z tehál	m3	2,117	85,000	179,95		
89	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,025	85,000	172,13		
70	K	9630511r	Búranie železobetónových schodov	m3	0,696	85,000	59,16		
71	K	965043421r	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazarín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, - rampa	m3	2,670	85,000	226,95		
72	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazariny so zváranou sieťou alebo rabcovým opletvom hr. nad 100 mm	m3	2,670	10,000	26,70		
73	K	96508181r	Búranie dlažieb, PVC, resp. parkiet	m2	724,700	1,000	724,70		
75	K	9680611260	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti	ks	45,000	0,500	22,50		
77	K	9680724550	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	89,135	3,000	267,41		
78	K	973011191r	Vysekanie alebo vyvrtanie prierazov - info cena	ks	9,000	1,000	9,00		
79	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	95,290	2,000	190,58		
80	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 116,899	1,800	2 010,42		
81	K	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	728,392	0,700	509,87		
82	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t - odhad	m2	132,181	1,200	158,62		
83	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,962	5,000	1 399,81		
84	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 319,278	0,230	1 223,43		
85	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	279,962	4,000	1 119,85		
86	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 119,848	0,100	111,99		
87	K	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácii - info cena	t	279,962	25,000	6 999,05		



KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
2 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: **Salka**

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: **31428568**
IČ DPH: **Sk2020399260**

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady	4 645,66
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 645,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	4 645,66	20,00%	929,13
znížená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 5 574,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **2 - Zdravotechnika**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum:
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady	4 645,66
HSV - Práce a dodávky HSV	2 647,88
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 647,88
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 997,78
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	218,63
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 478,80
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	300,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 645,66



Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček


Zhotoviteľ:


Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž


Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							4 645,66
d	HSV		Práce a dodávky HSV				2 647,88
d	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 647,88
20	K	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	254,000	6,000	1 524,00
21	K	974083112	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	508,000	1,200	609,60
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,890	9,000	89,01
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	187,910	0,200	37,58
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,890	7,000	69,23
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,560	0,800	31,65
26	K	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií - info.cena	t	9,890	29,000	286,81
d	PSV		Práce a dodávky PSV				1 997,78
d	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				218,63
37	K	7211718090	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripoivacieho do D160 -0.00263t	m	137,500	1,590	218,63
d	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 478,80
50	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	635,000	2,300	1 460,50
58	K	722250005r	Demontáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	súb.	3,000	6,100	18,30
d	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				300,35
65	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0.01933t	súb.	15,000	12,200	183,00
69	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t	súb.	17,000	5,200	88,40
75	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia diturývovej. -0.03470t	súb.	3,000	9,650	28,95



Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.		FAKTÚRA č.: O/21/019 Variabilný symbol: 21019											
Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: CSOB IBAN: SK26 7500 0000 0040 0891 3742 Účet / kód: 4008913742 / 7500		Odberateľ: Obec Salka Salka 61 943 61 Salka											
Obchodný register Okresneho sudu Nitra Oddiel: Sro Vlozka c. 3216/N Objednávka č.: Dodací list č.: O/21/019 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC SALKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td style="text-align: center;">- 2 -06- 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>183/2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> IČO: 00309249 DIČ: 2021074055		OBEC SALKA		Dátum:	- 2 -06- 2021	Číslo záznamu:	183/2021	Číslo spisu:		Prílohy:	Vybavuje:
OBEC SALKA													
Dátum:	- 2 -06- 2021												
Číslo záznamu:	183/2021												
Číslo spisu:													
Prílohy:	Vybavuje:												
		Dátum vyhotovenia: 31.05.2021 Dátum splatnosti: 30.06.2021 Daňová povinnosť: 31.05.2021 Dátum dodania: 31.05.2021											
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/													
	1,000	23 438,83 20,00	23 438,83										
		Celkom bez DPH : 23 438,83 EUR											
Rozpis DPH v EUR													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	23 438,83	4 687,77	28 126,60										
Súčet	23 438,83	4 687,77	28 126,60										
		Celkom : 28 126,60 EUR											
		Uhradiť : 28 126,60 EUR											
													
Vystavil: Renata Hevčová													



KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:

1_1 - Stavebná časť

JKSO:		KS:	
Miesto:	Salka	Dátum:	10.09.2021
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Salka		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31428568
Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž		IČ DPH:	Sk2020399260
Projektant:		IČO:	
Ing. Juraj Ďuriček		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Juraj Adam	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 862,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 862,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 862,36	20,00%	4 372,47
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nuľová	0,00	0,00%	0,00


Cena s DPH	v EUR	26 234,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum
-----------------	----------	-------




ROZPOČET


Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: **1_1 - Stavebná časť**


Miesto: Salka
 Objednávateľ: Obec Salka
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 10.09.2021
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 862,364
D	HSV		Práce a dodávky HSV				269,511
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				269,511
74	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy , - 0,01600t	ks	44,000	0,300	13,200
76	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených,	m2	116,505	2,200	256,311
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 592,853
D	712		Izolácie striech, poviakové krytiny				9 170,409
89	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	520,023	1,000	520,023
90	M	283230007300	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m,	m2	598,026	0,850	508,322
91	K	712300833	Odstánenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej. -0,01400t	m2	422,835	0,400	169,134
93	M	221430000100	Toluén pre nitráciu	t	0,042	1 456,000	61,152
94	M	245920000900	Zálievka, strešný doplnok, 2,5 kg,	kg	4,160	40,600	168,896
95	M	247410003000	Lepidlo polyuretánové 310 g,	ks	362,248	4,000	1 448,992
96	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá,	m2	598,026	8,000	4 784,208
97	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	520,023	1,000	520,023
98	M	693110001300	Geotextília polypropylénová PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná,	m2	598,026	1,500	897,039
104	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,620	1,000	92,620
D	713		Izolácie tepelné				12 422,444
105	K	71300004r	Odstánenie vrstiev plochej strechy až po panely - info cena	m2	422,835	0,800	338,268
110	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° , rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	422,835	1,000	422,835
201	M	283720010300	Doska EPS hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	m2	1 014,800	11,000	11 162,800
202	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	422,835	0,600	253,701
203	M	283760007500R	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech - spád hr. 40-20 mm	m3	19,450	8,000	155,600
116	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	89,240	1,000	89,240
D	764		Konštrukcie klampiarske				62,590
124	K	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	47,570	0,500	23,785
127	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	65,350	0,300	19,605
128	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	48,000	0,400	19,200



Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.		FAKTÚRA č.: O/21/036 Variabilný symbol: 21036																									
Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: CSOB IBAN: SK26 7500 0000 0040 0891 3742 Účet / kód: 4008913742 / 7500		Odberateľ: Obec Salka Salka 61 943 61 Salka																									
Obchodný register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro Vložka c. 3216/N		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBEC SALKKA</th> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>14 -09- 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>328/2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC SALKKA		Dátum:	14 -09- 2021	Číslo záznamu:	328/2021	Číslo spisu:		Prílohy:	Vybavuje:														
OBEC SALKKA																											
Dátum:	14 -09- 2021																										
Číslo záznamu:	328/2021																										
Číslo spisu:																											
Prílohy:	Vybavuje:																										
Objednávka č.: Dodací list č.: O/21/036		IČO: 00309249 DIČ: 2021074055																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 10.09.2021 Dátum splatnosti: 10.10.2021 Daňová povinnosť: 10.09.2021 Dátum dodania: 10.09.2021																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>21 862,36</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>21 862,36</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>21 862,36 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000	21 862,36	20,00		21 862,36	Celkom bez DPH :						21 862,36 EUR			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000	21 862,36	20,00		21 862,36																					
Celkom bez DPH :						21 862,36 EUR																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>21 862,36</td> <td>4 372,47</td> <td>26 234,83</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>21 862,36</td> <td>4 372,47</td> <td>26 234,83</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>26 234,83 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>26 234,83 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	21 862,36	4 372,47	26 234,83	Súčet	21 862,36	4 372,47	26 234,83	Celkom :			26 234,83 EUR	Uhradiť :			26 234,83 EUR
Rozpis DPH v EUR																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																								
základná 20%	21 862,36	4 372,47	26 234,83																								
Súčet	21 862,36	4 372,47	26 234,83																								
Celkom :			26 234,83 EUR																								
Uhradiť :			26 234,83 EUR																								
Vystavil: Renata Hevčová																											



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
1_1 - Stavebná časť

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum: 12.10.2021

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31428568
IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 787,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	38 787,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	38 787,70	20,00%	7 757,54
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

46 545,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

Miesto:

Salka

Dátum:

12.10.2021

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž



Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	38 787,70
HSV - Práce a dodávky HSV	6 637,64
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 144,92
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	492,72
PSV - Práce a dodávky PSV	32 150,06
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 656,83
713 - Izolácie tepelné	1 927,23
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 566,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 787,70



ROZPOČET


Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: 1_1 - Stavebná časť

Miesto: Salka
 Objednávateľ: Obec Salka
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 12.10.2021
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 787,704
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 637,644
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 144,924
22	K	314275237r	Kominová zostava DN 200 výšky 8 m - info cena	súb.	1,000	1 150,000	1 150,000
29	K	340238257	Zamurovanie otvorov tehľami keramickými (440x247x238)	m2	38,213	16,000	611,408
31	K	342243104	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2.5 (140x497x238)	m2	141,315	20,000	2 826,300
32	K	3422431060	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2.5 (100x500x238)	m2	86,512	18,000	1 557,216
D	99		Presun hmôt HSV				492,720
88	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,120	6,000	492,720
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 150,060
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				7 656,829
92	K	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	396,200	14,560	5 768,672
99	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	80,990	6,300	510,237
100	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový.	ks	647,920	0,200	129,584
101	M	607260000400	Doska OSB 3 nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm.	m2	50,214	9,000	451,926
102	K	7129910400	Montáž podkladnej konštrukcie z hranolov a lát atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	45,200	4,000	180,800
103	M	6051200033000	Hranoly na atike- vrátane impregnácie	m3	2,339	230,000	537,970
104	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,640	1,000	77,640
D	713		Izolácie tepelné				1 927,231
106	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	600,370	0,500	300,185
107	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2.	m2	690,426	0,240	165,702
112	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,904	6,800	488,947
113	M	283720004100	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 100 mm.	m2	82,690	6,000	496,140
114	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	48,594	6,800	330,439
115	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm.	m2	49,566	2,400	118,958
116	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,860	1,000	26,860
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				22 566,000
152	M	5534160550r	Plastové okno 1700x1800 mm - O1 - info cena	ks	8,000	426,000	3 408,000
153	M	5534160550rr	Plastové okno 1400x1800 mm - O2 - info cena	ks	4,000	379,000	1 516,000
154	M	5534160550r1	Plastové okno 500x1200 mm - O3 - info cena	ks	4,000	138,000	552,000
155	M	5534161000r	Plastové okno 750x1450 mm - O4 - info cena	ks	1,000	170,000	170,000
156	M	5534160940r	Plastové okno 1100x1450 mm - O5 - info cena	ks	1,000	203,000	203,000
157	M	6114100104001k	Plastové okno 1670x1450 mm - O6 - info cena	ks	2,000	341,000	682,000
158	M	61141001040002	Plastové okno 870x1450 mm - O7 - info cena	ks	1,000	184,000	184,000
159	M	611410010400102	Plastové okno 540x770 mm - O8 - info cena	ks	1,000	105,000	105,000
160	M	611410010400122	Plastové okno 760x770 mm - O9 - info cena	ks	3,000	112,000	336,000
161	M	611410010400132	Plastové okno 780x770 mm - O10 - info cena	ks	4,000	112,000	448,000
162	M	611410010400r132	Plastové okno 1100x1500 mm - O11 - info cena	ks	1,000	203,000	203,000
163	M	611410010400s132	Plastové okno 1850x1750 mm - O12 - info cena	ks	1,000	454,000	454,000
164	M	611410010400st132	Plastové okno 1040x1750 mm - O13 - info cena	ks	1,000	248,000	248,000
165	M	611410010400stt132	Plastové okno 2250x1800 mm - O14 - info cena	ks	1,000	602,000	602,000
166	M	611410010400str132	Plastové okno 750x1800 mm - O15 - info cena	ks	1,000	195,000	195,000
167	M	611410010400strtf132	Plastové okno výdajné 700x1000 mm - O16 - info cena			190,000	380,000
168	M	611410010400142	Vonkajšie plastové dvere 900x2000 mm - Označenie 7 - info cena			895,000	1 790,000
169	M	611410010400142a	Vonkajšie plastové dvere 1800x2450 mm - Označenie 8 - info cena			809,000	1 809,000

170	M	611410010400142b	Vonkajšie plastové dvere 2245x2200 mm - Označenie 9 - info cena	ks	1,000	1 266,000	1 266,000
171	M	611410010400142c	Vonkajšie plastové dvere 800x2000 mm - Označenie 10 - info cena	ks	1,000	883,000	883,000
172	M	611410010400142d	Vonkajšie plastové dvere 800x1980 mm - Označenie 12 - info cena	ks	1,000	765,000	765,000
173	M	611410010400142e	Plastová zasklená stena 4900x2820 mm - označenie ZS1 - info cena	ks	1,000	2 735,000	2 735,000
174	M	611410010400142f	Hliniková požiarna zasklená stena 1500x2820 mm - označenie ZS2 - info cena	ks	1,000	3 632,000	3 632,000
179	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	288,510	1,000	288,510



Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.		FAKTÚRA č.: O/21/043 Variabilný symbol: 21043									
Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: CSOB IBAN: SK26 7500 0000 0040 0891 3742 Účet / kód: 4008913742 / 7500		Odberateľ: Obec Salka Salka 61 943 61 Salka									
Obchodný register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro Vložka c. 3216/N Objednávka č.: Dodací list č.: O/21/043		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBEC SALKKA</th> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>15-10-2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC SALKKA		Dátum:	15-10-2021	Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
OBEC SALKKA											
Dátum:	15-10-2021										
Číslo záznamu:	Číslo spisu:										
Prílohy:	Vybavuje:										
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČO: 00309249 DIČ: 2021074055									
		Dátum vyhotovenia: 12.10.2021 Dátum splatnosti: 11.11.2021 Daňová povinnosť: 12.10.2021 Dátum dodania: 12.10.2021									
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH									
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000 38 787,70 20,00 38 787,70									
		Celkom bez DPH : 38 787,70 EUR									
Rozpis DPH v EUR											
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom							
	základná 20%	38 787,70	7 757,54	46 545,24							
	Súčet	38 787,70	7 757,54	46 545,24							
			Celkom :	46 545,24 EUR							
			Uhradiť :	46 545,24 EUR							
Vystavil: Renata Hevčová		
